

第127回 暁木一水会 例会の記録

1. 日 時 平成25年11月6日（水） 14:30～20:15
 2. 見学会 兵庫県立尼崎総合医療センター 建設現場見学
 3. 出席者 14名
 4. 懇親会（於，楠公会館） 23名
-

■ 現場見学

工事概要の説明会



現場見学の様子



見学者集合写真



■ 懇親会の様子



本下代表世話人の挨拶



飛岡博明氏による乾杯



懇親会の様子




畑 恵介氏による中締め挨拶

兵庫県立尼崎総合医療センター（仮称）建築概要



外観パース(県道側より)

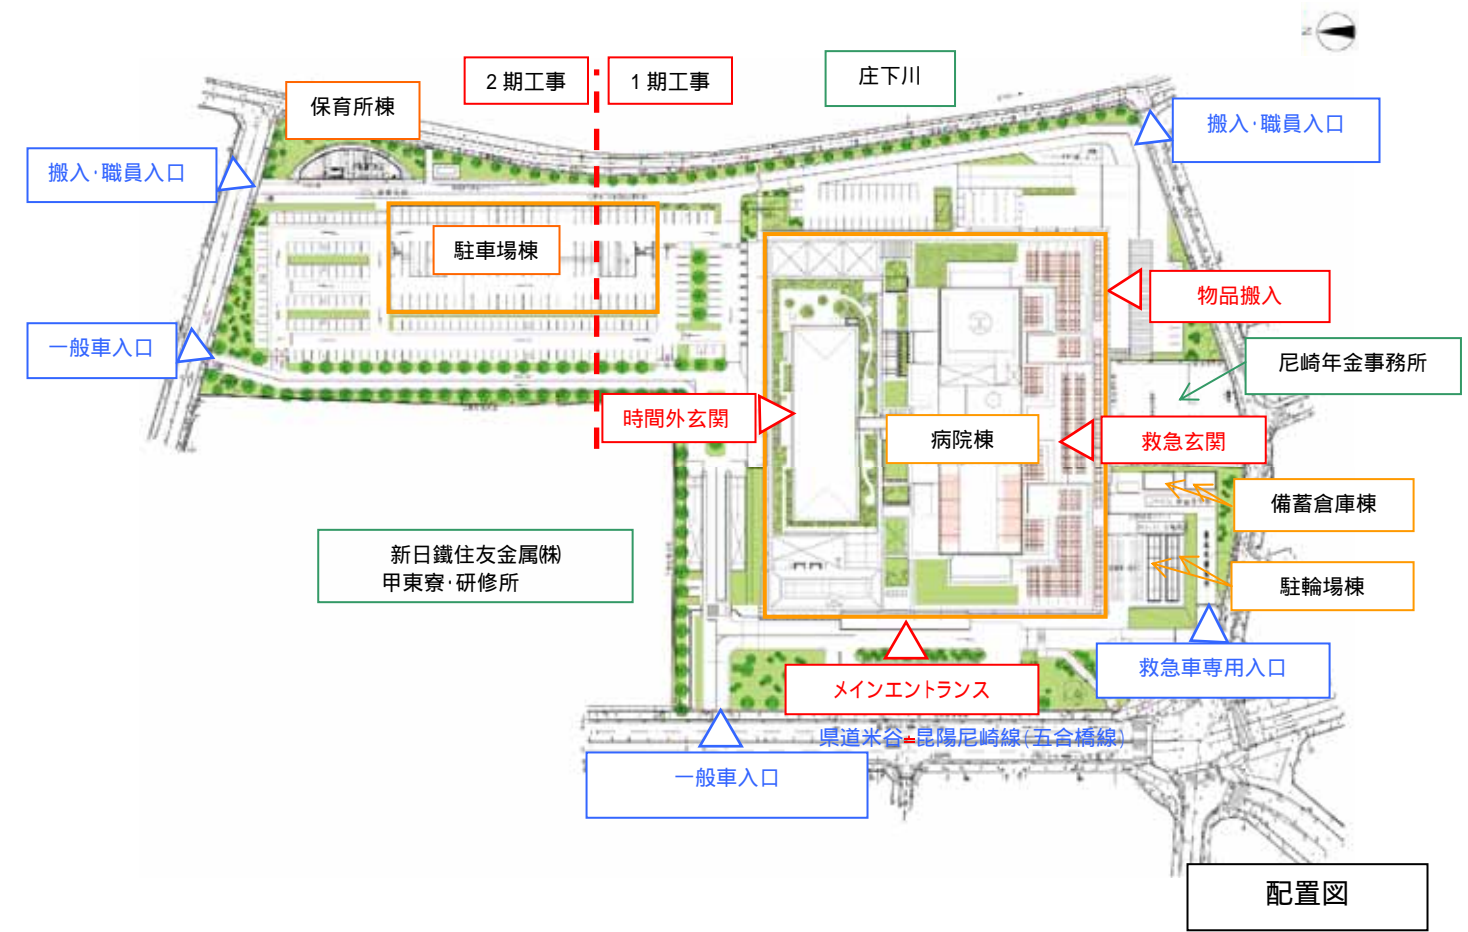

工事名称: 県立尼崎・塚口統合新病院第1期建築工事

- 発注者 : 兵庫県
- 設計監理 : 株式会社 日建設
- 施工者 : 熊谷・明和・丸正特別共同企業体
- 別途工事施工者 [電気] 関電工・銭屋電機・サン電設特別共同企業体
- [空調] 三機・日設・三神特別共同企業体
- [衛生] 三晃・長村・長田松田特別共同企業体
- [特高] 栗原・共栄特別共同企業体
- [昇降機] 三菱電機ビルテクノサービス株式会社
- [ガス] 大阪ガス株式会社エネルギー事業部

敷地概要

- 工事場所 : 兵庫県尼崎市東難波町2丁目176-1
- 敷地面積 : 37,120.73 m²
- 用途地域 : 準住居地域 / 第一種住居地域(西側道路境界線より30m)
- 容積率/建蔽率 : 200% / 60%
- 防火地域指定 : 準防火地域・防火地域(西側路中心線から20m)他

建物概要

- 主体構造 : 鉄骨鉄筋コンクリート造一部鉄筋コンクリート造、鉄骨造(免震構造)
- 規模 : 地上11階地下1階塔屋2階(屋上ヘリポート設置) 最高高さ57.58m 軒高:47.68m
- 建築面積 : 13,420.02 m²
- 延べ面積 : 77,377.76 m²(病院棟) 敷地内棟数: 6棟
- 付帯施設 : 仮設保育所(軽量鉄骨造平家)、備蓄倉庫棟(軽量鉄骨造平家建)2棟、駐輪場2棟
- 主な仕上 : [外壁]磁器質タイル貼・押出成形セメント板の上多機能型単層弾性仕上材・黄竜山石貼・杉材貼
- [屋根]露出アスファルト防水及び押えコンクリート・一部屋上緑化
- [外構]アスファルト舗装(一部透水性)インターロッキング舗装・磁器質タイル貼
- [基礎構造]場所打ちコンクリート杭(杭長約32m)、基礎底深さ:SGL-8.62m

病院概要

- 病床数 : 730床
- 診療科 : 39科 手術室:18室(手術部門) 部門内簡易手術及び救急初療手術 計2室
- 主な特殊機能 : 救命救急センター機能、周産期母子医療センター機能(MFICU・GCU・NICU・小児救急機能(PICU))、2種感染病室(8)
- 工期 : 平成24年8月29日~平成26年11月28日(27か月 解体工事を含む)



標準病棟平面
